



Tutorial da Plataforma

Perfil Gerente de Projetos



NO PASSO CERTO

MPO

Os 7 Passos para Monitoramento e Avaliação de Projetos Estratégicos

2024



O **Veredas** é uma ferramenta de **monitoramento de projetos** do MPO, desenvolvida pela **SAGE**, que visa proporcionar o acompanhamento e dar visibilidade aos **projetos** que **compõem o PEI**.

PEI Planejamento Estratégico Institucional
Ministério do Planejamento e Orçamento



Vamos ao Sistema?
<https://bit.ly/veredasmpo>

- P01 - SMA**
Novo Cor Políticas
- P02 - SMA**
Avaliação 2019-2027
- P03 - SMA**
Criação de
- P04 - SMA**
Série Avaliação e Melhoria do Gasto Público
- P05 - SMA**
Apio à Formulação de Políticas Públicas e Projetos de Governo (Avaliações Ex ante)
- P06 - SEPLAN**
Novo Modelo do Ciclo de Gestão do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027
- P07 - SEPLAN**
Observatório do planejamento - módulo de médio prazo - Portal PPA Aberto
- P08 - SEPLAN / SMA**
Avaliação integrada à revisão do planejamento
- P09 - SOF**
Agendas transversais e multisectoriais no orçamento

Indicador Geral do PEI



Evolução do Cronograma



Agenda

- P27 - 27/02/2024**
Apresentação da Plataforma Veredas
- P27 - 29/02/2024**
Kick-off Mapeamento de Processos da Coordenação de Orçamento e Finanças

Notícias

- P17** - Ser eficiente com gasto público significa priorizar, colocar metas e perseguí-las?, diz Tebet
- P09** - Orçamento para Agendas Principais e Ações Transversais soma R\$ 405,3 bilhões em 2024
- P21** - MPO participa da Conferência "Uma Região de Soluções Globais" e debate as Rotas de Integração da América do Sul
- P12** - Relatório sintetiza a importância e o grau de transversalidade da agenda ambiental no PPA 2024-2027
- P21** - Tebet anuncia projeto de planejamento programa de integração regional em 2024

Documentos

SLIDE SMIANIA COM



Certifique-se de
estar na **rede**
interna do MPO



Caso esteja em
trabalho remoto,
habilite sua **VPN**

Sobre o Veredas



O Veredas é uma ferramenta de monitoramento de projetos do Ministério do Planejamento e Orçamento, desenvolvida pela Subsecretaria de Administração e Gestão Estratégica (SAGE), que visa proporcionar o acompanhamento e dar visibilidade aos projetos que compõem o Plano Estratégico Institucional (PEI).

Veredas são faixas de terreno usadas para transitar. Também podem ser sinônimo de caminhos, estradas, vias, passagens, acessos, direções, rumos, trilhas, ruas, avenidas, rodovias, atalhos, vielas, carreiros.

Nesse sentido, a plataforma representa o meio pelo qual o percurso dos projetos será acompanhado de forma sistemática e contínua, onde eventuais desvios em relação aos objetivos poderão ser observados, viabilizando ações necessárias para realinhamento de sua trajetória em tempo hábil.

À ESQUERDA

Lista de Projetos cadastrados no PEI

Projetos PEI	Andamento
P01 - SMA Novo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) - ciclos 2023-2024	0% →
P02 - SMA Avaliação da efetividade do CMAP durante os ciclos 2019-2021	0% →
P03 - SMA Criação da rede de monitoramento e avaliação	0% →
P04 - SMA Série Avaliação e Melhoria do Gasto Público	0% →
P05 - SMA Apoio à Formulação de Políticas Públicas e Projetos de Governo (Avaliações Ex ante)	0% →

GENTRO DA TELA

Indicador geral da evolução do PEI



À DIREITA

Agenda

P27 - 27/02/2024
Apresentação da Plataforma Veredas

P27 - 29/02/2024
Kick-off Mapeamento de Processos da Coordenação de Orçamento e Finanças

Notícias

P17 - Ser eficiente com gasto público significa priorizar, colocar metas e perseguí-las?, diz Tebet

P09 - Orçamento para Agendas Principais e Ações Transversais soma R\$ 405,3 bilhões em 2024

P21 - MPO participa da Conferência "Uma Região de Soluções Globais" e debate as Rotas de Integração da América do Sul

P12 - Relatório sintetiza a importância e o grau de transversalidade da agenda ambiental no PPA 2024-2027

P21 - Tebet anuncia projeto de planejamento e programa de integração regional em 2024

Documentos


P27 - Manual do Processo - Suprir Unidades com Material de Consumo

Selecione qualquer um dos Projetos listados à esquerda da tela para maiores detalhes

Projetos PEI	Andamento
P01 - SMA Novo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) - ciclos 2023-2024	0%
P02 - SMA Avaliação da efetividade do CMAP durante os ciclos 2019-2021	0%
P03 - SMA Criação da rede de monitoramento e avaliação	0%
P04 - SMA Série Avaliação e Melhoria do Gasto Público	0%
P05 - SMA Apoio à Formulação de Políticas Públicas e Projetos de Governo (Avaliações Ex ante)	0%

Indicadores

TAP

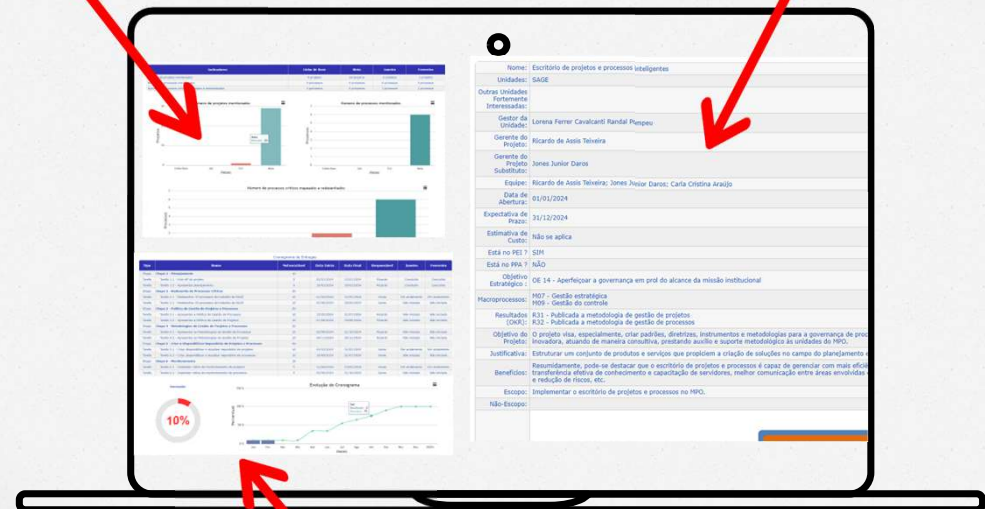

Cronograma de entregas

À direita estão informações de **eventos,**
notícias e documentos, incluídas e editadas
pelos Gerentes de Projeto

Essas informações permanecem disponíveis
para visualização e download **a todos que**
consultarem a Plataforma, independente de
cadastro



Agenda

P27 - 27/02/2024
Apresentação da Plataforma Veredas

P27 - 29/02/2024
Kick-off Mapeamento de Processos da
Coordenação de Orçamento e Finanças

Notícias

P17 - Ser eficiente com gasto público significa
priorizar, colocar metas e persegui-las?, diz
Tebet

P09 - Orçamento para Agendas Principais e
Ações Transversais soma R\$ 405,3 bilhões em
2024

P21 - MPO participa da Conferência "Uma
Região de Soluções Globais" e debate as Rotas
de Integração da América do Sul

P12 - Relatório sintetiza a importância e o grau
de transversalidade da agenda ambiental no PPA
2024-2027

P21 - Tebet anuncia projeto de planejamento e
programa de integração regional em 2024



Documentos

P27 - Manual do Processo - Suprir Unidades
com Material de Consumo



Acesso dos Gerentes de Projetos

Usuário:

Senha:

VEREDAS

Usuários Cadastrados

Sua nova senha deve ser de no mínimo 6 caracteres entre números e letras.

Senha atual:

Nova senha:

Confirme a nova senha:

Atualizar Senha

No seu primeiro acesso, sugerimos que faça a troca de senha, por questões de segurança

Ricardo de Assis Teixeira



- ✓ Você verá apenas o projeto que gerencia
- ✓ O sistema estará aberto para monitoramento até o dia 10 de cada mês
- ✓ Somente nesse primeiro uso, o monitoramento de janeiro e fevereiro está aberto até dia 15 de março



Última atualização de Monitoramento

Cronograma de Entrega	Indicadores	Avaliação Mensal	Avaliação de KR
			R28  R29 
			R31  R32 

Na tela dos seus projetos, o indicativo do status de envio das informações de monitoramento podem estar como: "confirmadas", "aguardando" ou "fora do prazo"

Painel de Monitoramento







- ✓ Indique a evolução do **status** das tarefas;
- ✓ Quando marcar **"concluído"**, descreva as evidências;
- ✓ Se desejar, **anexe 1 arquivo** para essa evidência

Cronograma de Entregas

Tipo	Nome	Data Início	Data Final	Acompanhamento		Descrição de evidência da conclusão (obrigatório, se Tarefa concluída)	Arquivo de Evidência (opcional, se Tarefa concluída)
				Janeiro 2024	Fevereiro 2024		
Etapa	Etapa 1: Planejamento da Avaliação						
Tarefa	Tarefa 1.1: Definição do método de avaliação	01/01/2024	13/01/2025	Concluído	Concluído	abcbabc	Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido
Tarefa	Tarefa 1.2: Inserindo Tarefa 1.2	01/01/2024	12/02/2024	Em andamento	Em andamento		Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido
Tarefa	Tarefa 1.3: Inserindo Tarefa 1.3	01/01/2024	12/03/2024	Não iniciado	Concluído	abcbabc	Arquivo Atual: Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido
Etapa	Etapa 2: Planejamento da Avaliação						
Tarefa	Tarefa 2.1: Definição do método de avaliação	01/01/2024	12/06/2024	Em andamento	Concluído	A tarefa foi concluída inserindo as tabelas necessárias	Arquivo Atual: Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido
Tarefa	Tarefa 2.2: Definição do método de avaliação	01/01/2024	12/07/2024	Concluído	Concluído	Método de Avaliação foi implementado com sucesso conforme reunião de aprovação	Arquivo Atual:

Lembre-se de clicar em "Inserir" antes de avançar para os próximos quadros

Indicadores	Linha de Base	Meta	Grandeza	Acompanhamento		
				Janeiro 2024	Fevereiro 2024	Março 2024
Teste de indicador 1 nm mm	45	78	%	Observado: 27 %	Observado: 66 %	
Teste de indicador 2	0.45	0.569	unidades	Observado: 0,47	Observado: 0,51	
Teste de indicador 3	1	5	processos	Observado: 1	Observado: 4	

Inserir Acompanhamento de Indicadores

Quadro de Indicadores

Basta informar o resultado observado no mês de referência, que esta evolução se refletirá nos gráficos de acesso público



Lembre-se de clicar em "Inserir" antes de avançar para os próximos quadros

Atenção!

Mesmo que não haja **nenhuma movimentação** no seu projeto durante o mês, não deixe de entrar na plataforma no período de abertura do monitoramento (dia 1º a 10) e clicar em "Inserir" **nesses quadros**

Assim, o Gerente de Projetos confirma que as **tarefas** não avançaram e que os **indicadores** permanecem como no mês anterior

Inserir Acompanhamento de Cronograma de Entregas

Inserir Acompanhamento de Indicadores

Resultados-Chave	Resultado Alcançado	Evidências
R01 - Concluído o ciclo CMAP 2024, seguindo um ciclo curto, com todas as avaliações executivas entregues e recomendações aprovadas	SIM	Conseguimos a Meta desse KR
R02 - Elaborado relatório técnico com recomendações para embasar a concepção do projeto de lei complementar (PLP)	NÃO	
R12 - Integrado o PPA 2024-2027 com os Planos Regionais de Desenvolvimento, por meio da pactuação de 778	NÃO	

Alterar Avaliação de Resultador KR

Quando o resultado for alcançado, ou quando chegar ao fim do exercício, descreva as evidências aqui



Resultados-Chave (KRs)

Lembre-se de clicar em "Alterar" antes de avançar para o próximo quadro


O texto das avaliações mensais servirá de base para a construção de outros relatórios, como os trimestrais e o Relatório de Gestão

Avaliador	Mês/Ano	Avaliação
Carla Cristina Araújo (Gerente do Projeto)	2024.02 - Fevereiro	

Arquivos que subsidiam a avaliação mensal do Projeto P26 (opcional)

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Inserir Avaliação Mensal

Avaliações Anteriores		
Mês	Avaliador	Avaliação
 2024.02 - Fevereiro	Álvaro José de Andrade Carneiro (Gerente do Projeto)	O Projeto P26 está sendo executado conforme planejado. No período avaliado ocorreram avanços na definição da plataforma Microsoft PowerApps (Microsoft) elaborado pela SEPLAN para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) e finalísticas para uso da Intranet no SharePoint (Microsoft). 3. Possibilidade do uso do TransfereG... definição da política de Transformação Digital. Assim, existe uma boa perspectiva para execução

Lembre-se de clicar em "Inserir" antes de avançar para os próximos quadros

Quem avalia?

- ✓ Gerente do Projeto
- ✓ Comitê de Governança

PRA FINALIZAR O MONITORAMENTO:

Faça uma avaliação criteriosa e qualitativa, destaque avanços e dificuldades observados no período

Com isso a inserção das informações de monitoramento estará completa



Todos os meses, até o 10º dia, o sistema estará aberto para os Gerentes de Projeto efetuarem o monitoramento do mês anterior


Fique atento às informações contidas em cada mês, pois elas não deverão ser modificadas nos meses seguintes



A qualquer tempo o Gerente de Projetos pode incluir informações adicionais sobre o andamento dos projetos



Informações
adicionais
para os
projetos




No botão **"Evento"** indique data, título, descrição e link. Defina o prazo que quer manter a divulgação do evento



Em **"Notícias"** insira título, descrição e link para a publicação original de notícias pertinentes ao seu projeto. Defina o prazo em que a notícia ficará visível na plataforma

No botão **"Documentos"** é possível disponibilizar qualquer material que desejar, em diversos formatos


Os eventos, notícias e documentos colocados pelos Gerentes de Projeto ficam visíveis a todos que acessarem a plataforma



Contatos

 cgges@planejamento.gov.br

 2020-5284 / 2020-4683

 Esplanada dos Ministérios,
Bloco K, Sala 318

O Veredas está em constante aperfeiçoamento e poderá ser uma ferramenta de transparência do Ministério do Planejamento e Orçamento para acompanhamento público de projetos.

Inicialmente ele está disponível apenas para uso do público interno do MPO. Caso tenha dificuldade de acesso, dúvidas ou sugestões de melhoria da ferramenta, comunique-se com a gente.





**BONS
Projetos!**
